

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely

az

**MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.**

mint Megrendelő

és

az

**MVM ERBE ZRT.**

mint Vállalkozó

között

**„Konténment lassú túlnyomódás megakadályozása baleseti helyzetben” tárgyú  
munka elvégzésére vonatkozóan jött létre**

4000290973 /

Ulrich István (Szakmai terület szignózáása), Bódi László (Igénylő szervezet vezetőjének szignózáása), Meczker-Eigner Zita  
(Pénzügyi terület szignózáása), Dr. Katona Kolos (Jogi szignózáása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózáása)



## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A jelen szerződésmódosítás (Szerződésmódosítás) az **MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint megrendelő (Megrendelő), és az **MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint vállalkozó (Vállalkozó) (Megrendelő és Vállalkozó bármelyike **Fél**, együttesen **Felek**) között a 2015. január 09. napján létrejött KM001/2014/MVM ERBE számú Keretmegállapodás (Keretmegállapodás) alapján 2017. október 04. napján megkötött, majd 2017. október 26. napján módosított „Konténment lassú túlnyomódás megakadályozása baleseti helyzetben” tárgyú szerződést (Szerződés) módosítja a Szerződésmódosításban meghatározott időpontban az alábbi tartalommal:

#### Felek adatai:

|                   |                           |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Megrendelő</b> | Cégeve                    | <b>MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b>                                                                                                                           |
|                   | Székhelye                 | 7030 Paks, Hrsz.: 8803/17.                                                                                                                                                              |
|                   | Cégjegyzékszám            | 17-10-001113                                                                                                                                                                            |
|                   | Adószáma                  | 10742833-2-17                                                                                                                                                                           |
|                   | Közösségi adószáma        | HU10742833                                                                                                                                                                              |
|                   | Bankszámlaszáma           | ERSTE Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-19798972                                                                                                                                      |
|                   | Szerződés száma           | 4000290973; 4000290974                                                                                                                                                                  |
| <b>Vállalkozó</b> | Cégeve                    | <b>MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság</b>                                                                                                               |
|                   | Székhelye                 | 1117 Budapest, Budafoki út 95.                                                                                                                                                          |
|                   | Cégjegyzékszám            | 01-10-045821                                                                                                                                                                            |
|                   | Adószáma                  | 14116713-2-44                                                                                                                                                                           |
|                   | Közösségi adószáma        | HU14116713                                                                                                                                                                              |
|                   | Bankszámlaszáma           | UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000003-34050007                                                                                                                                  |
|                   | EUR számlaszám            | Erste Bank Hungary Zrt.<br>Számlaszám / Account No. 11600006-00000000-40937836<br>Nemzetközi bankszámlaszám / IBAN HU47 1160 0006 0000 0000 4093 7836<br>Számla pénzneme / Currency EUR |
|                   | Vállalkozó szerződésszáma | 13A401018000                                                                                                                                                                            |

1. A műszaki tervezési alapadatok, illetve a vállalkozási szerződés terjedelmébe tartozó elemek és berendezések változásainak kezeléséből adódó időráfordítás miatt a projekt megvalósítását részben át kellett ütemezni. Felek közös megegyezéssel

4000290973 /

Ulrich István (Szakmai terület szignózása), Bódi László (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Katona Kolos (Jogi szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)

megállapodnak abban, hogy a Szerződést a kivitelezési határidők módosulása miatt az alábbiak szerint módosítják.

**2. A Szerződés 6.2 pontja az alábbiak szerint módosul:**

„6.2 A Vállalkozó az egyes részteljesítéseket követően jogosult számla benyújtására. A 3. sz. melléklet 2. pontjában (Fizetési ütemterv, kötbérköteles határidők) foglalt táblázat szerinti 3., 8., 10., 13., 15., 16., 17., 18. és a 19. részszámlák számlázása és kifizetése euróban történik.”

3. **A Szerződés 2. számú „Kiviteli ütemterv” melléklete a jelen 2. számú Szerződésmódosításhoz 1. számú mellékletként csatolt tartalom szerint módosul.**
4. **A Szerződés 3. számú „Tételes költségvetés és fizetési ütemterv” mellékletének 2. pontja (Fizetési ütemterv, kötbérköteles határidők) a jelen 2. számú Szerződésmódosításhoz 2. számú mellékletként csatolt tartalom szerint módosul.**
5. A Felek kijelentik, hogy a jelen 2. számú Szerződésmódosítás megkötésére nem a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból került sor, és hogy a jelen 2. számú Szerződésmódosítással kapcsolatban egymással szemben semmilyen igényt (kötbér, kártérítés stb.) nem támasztanak.
6. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen 2. számú szerződésmódosítással érintett részhatáridők módosítása nem eredményez változást a teljesítési véghatáridőben.
7. A Szerződés jelen 2. számú Szerződésmódosítás által nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak. A jelen 2. számú Szerződésmódosítás a Szerződés és annak módosításai elválaszthatatlan részét képezi és azokkal együtt érvényes.
8. A jelen 2. számú Szerződésmódosítás mindkét Fél részéről történő aláírásával lép érvénybe.
9. A jelen 2. számú Szerződésmódosításban nem szabályozott egyéb kérdésekben a magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók.

10. A jelen 2. számú Szerződésmódosítás 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből mindegyik Fél 2-2 (kettő-kettő) példányt kap.

Paks, 2018. ...06. 11. ....

Budapest, 2018. ...06. 11. ....

  
Hamvas István László  
vezérigazgató

  
Pekár Géza  
műszaki  
vezérigazgató-  
helyettes

  
Dr. Korom Norbert Lajos  
vezérigazgató



  
Százuj István  
projekt igazgató

**MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság**

**MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**MEGRENDELŐ**

**VÁLLALKOZÓ**

|                                                                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Szigetelési információ                                                                                 |                                          |
| Ulrich István        | Szakmai terület szignózása               |
| Bódi László                                                                                            | Igénylő szervezet vezetőjének szignózása |
| Meczker-Eigner Zita                                                                                    | Pénzügyi terület szignózása              |
| Dr. Katona Kolos    | Jogi szignózása                          |
| Molnár Milán Lajos  | Logisztikai vezető szignózása            |





**1. sz. melléklet**

**A Szerződés 2. számú mellékletének („Kivíteli ütemterv”) módosítása**

4000290973 /

Ulrich István (Szakmai terület szignózása), Bódi László (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Katona Kolos (Jogi szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)

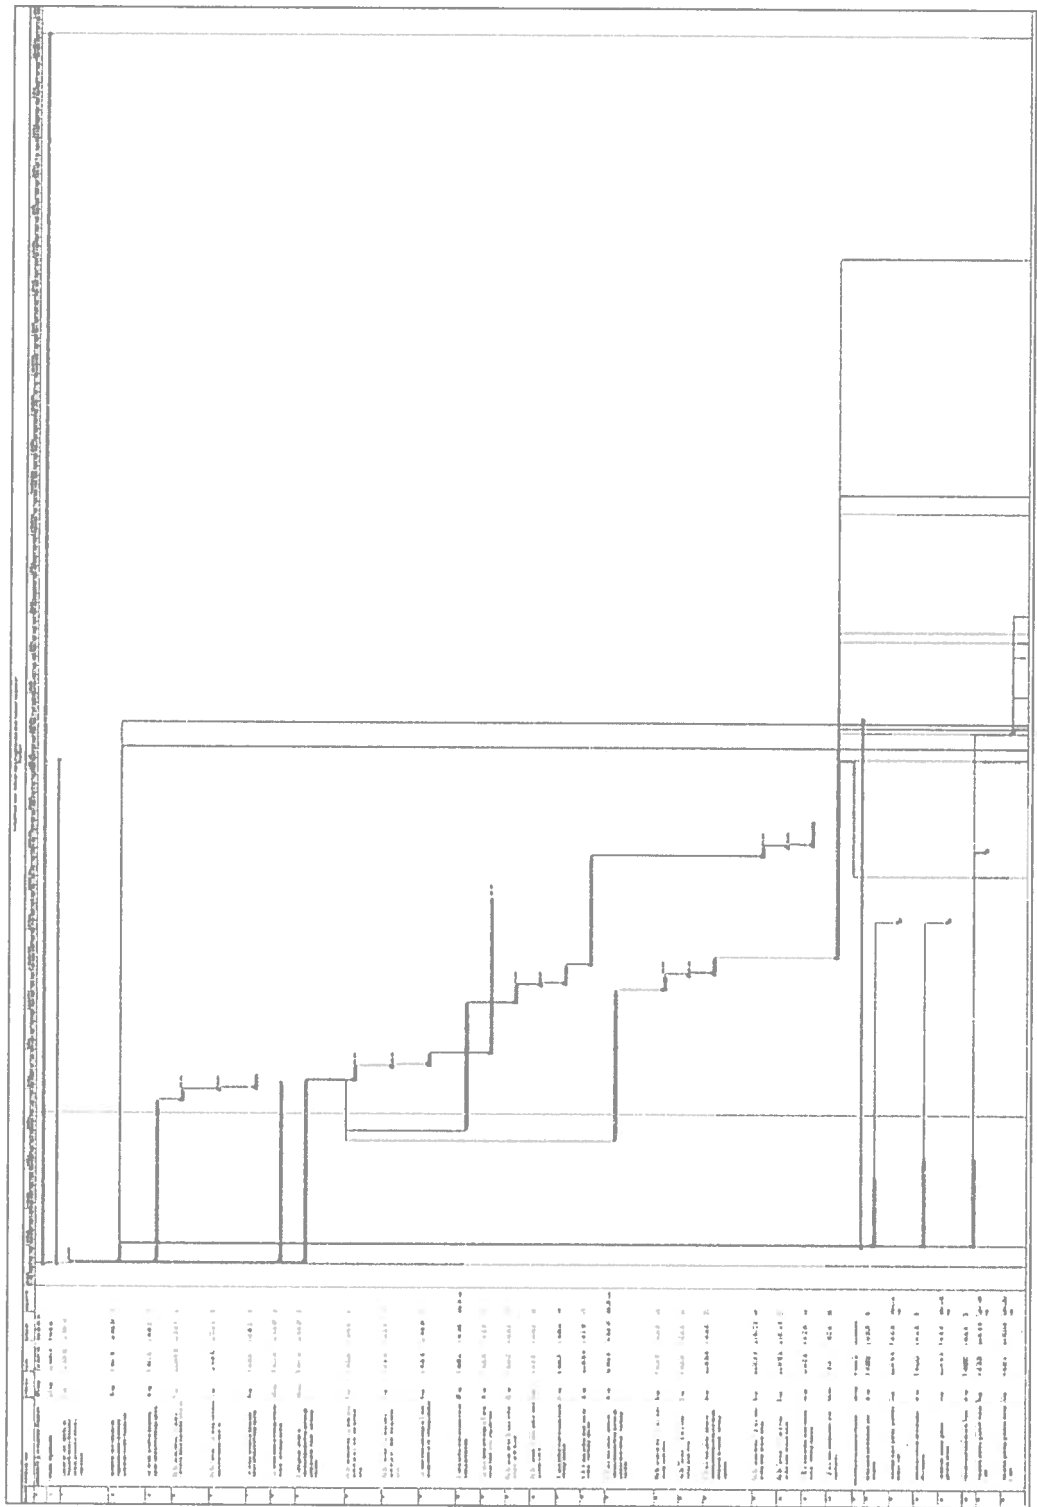

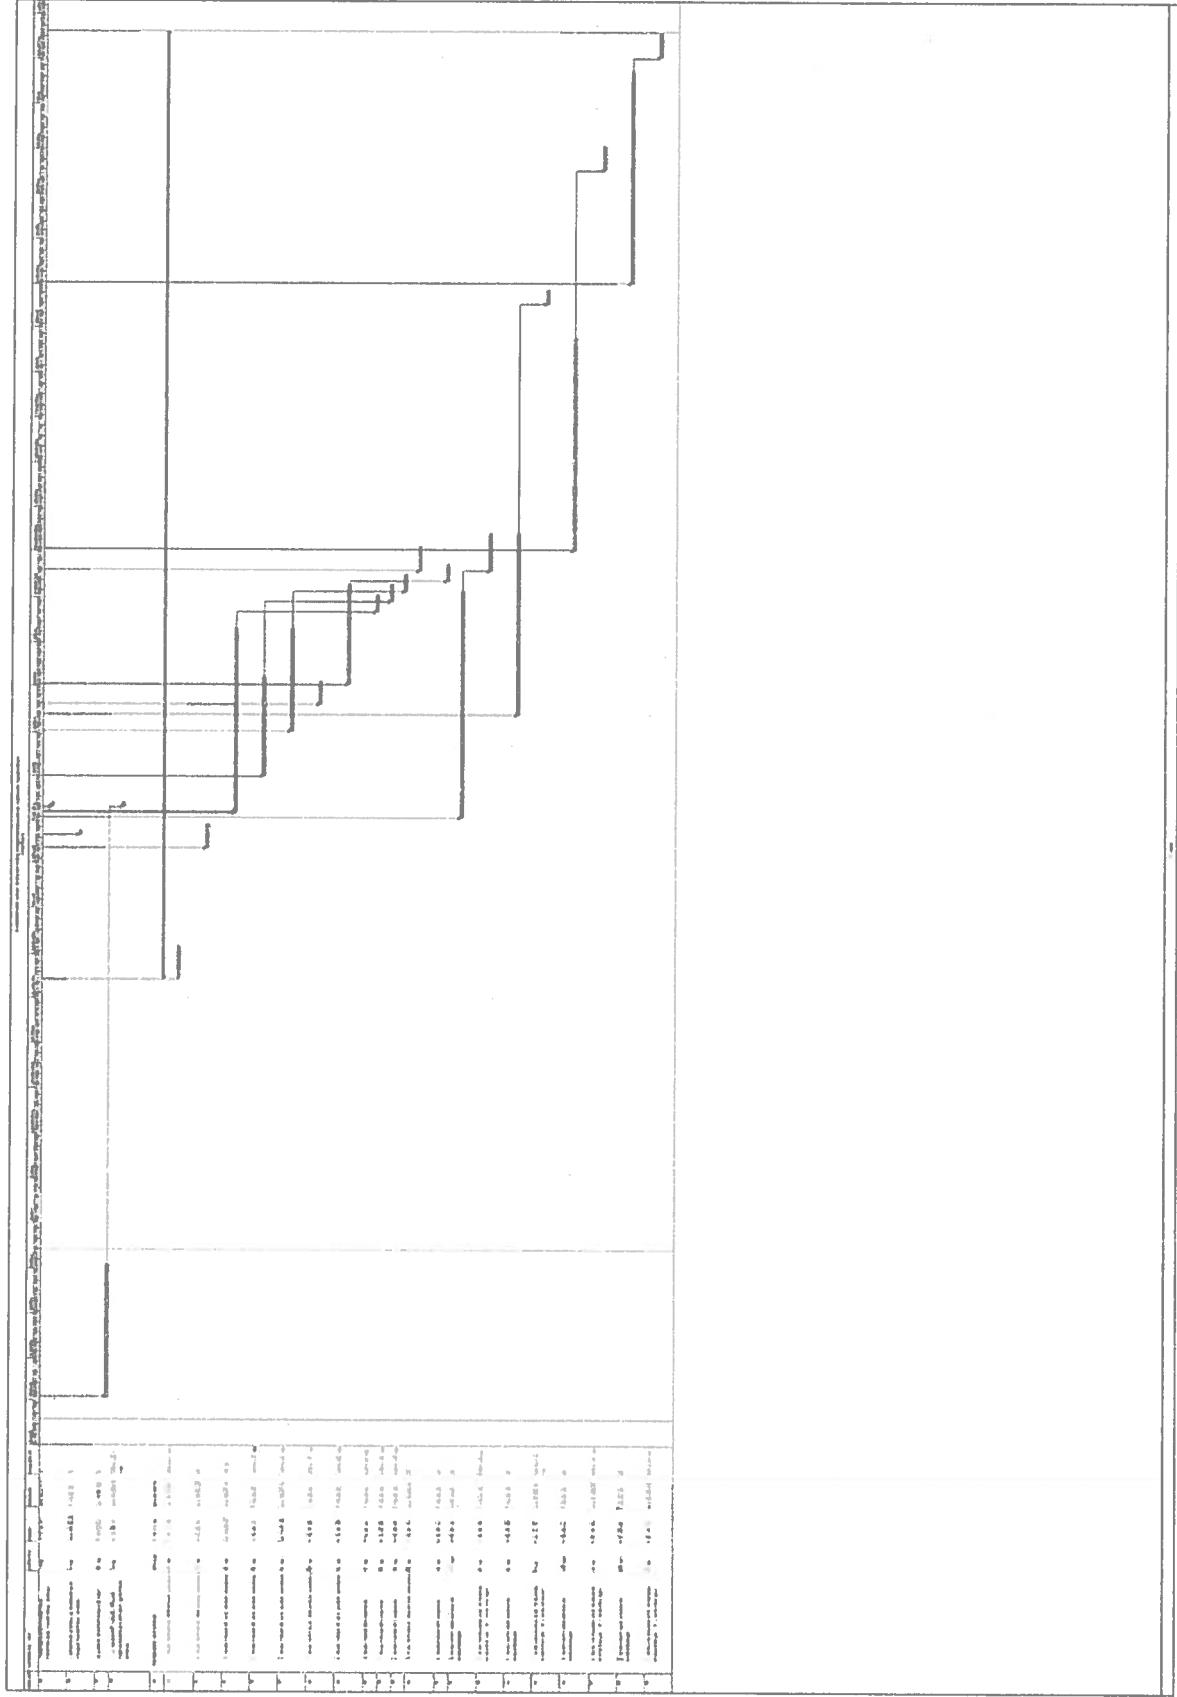

## 2. sz. melléklet

### A Szerződés 3. számú melléklete („Tételes költségvetés és fizetési ütemterv”) 2. pontjának módosítása

#### 2. Fizetési ütemterv, kötbérköteles határidők

A 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19. tételek kötbérköteles határidők.

A Vállalkozó az alábbi részszámlák benyújtására jogosult:

| Ssz. | Megnevezés                                                                                                                                                       | Határidő                | Összeg                           |                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                  |                         | EUR-ban számlázandó és fizetendő | Ft-ban számlázandó és fizetendő |
| 1.   | Végleges minőségügyi terv és megvalósítási ütemterv átadása                                                                                                      | 2017.10.31. (teljesült) |                                  | 104 996 391 Ft                  |
| 2.   | Tervezési Specifikáció minőségi teljesítése, 1-4. blokki terjedelemben a csőátvezetésekre vonatkozó építési engedélyezési és szerelési terv minőségi teljesítése | 2017.12.10. (teljesült) |                                  | 104 996 391 Ft                  |
| 3.   | Gyártási és beszerzési engedélyezési dokumentáció átadása; szivattyúkra, kúpos csapokra és egyéb armatúrákra vonatkozóan kompletten                              | 2018.06.15.             | 363 906 EUR                      |                                 |
| 4.   | 1.-4. blokki közös és 3.blokkra vonatkozó kiviteli tervek mennyiségi teljesítése                                                                                 | 2018.06.15.             |                                  | 125 995 670 Ft                  |
| 5.   | 1.-4. blokki közös és 3.blokkra vonatkozó kiviteli tervek minőségi teljesítése                                                                                   | 2018.07.06.             |                                  | 293 985 566 Ft                  |
| 6.   | Szoftver kiviteli tervek minőségi teljesítése                                                                                                                    | 2018.08.25.             |                                  | 24 654 109 Ft                   |
| 7.   | 2. ; 1. ; 4. blokkra vonatkozó kiviteli tervek minőségi teljesítése                                                                                              | 2018.08.31.             |                                  | 104 996 391 Ft                  |
| 8.   | Berendezések leszállítása I. ütem: 1-4 blokki kúpos csapok, 1-4 blokki visszacsapó és egyéb szerelvények leszállítása                                            | 2018.10.10.             | 1 881 954 EUR                    |                                 |
| 9.   | Hermetikus átvezetés készre szerelése az 1. blokkon                                                                                                              | 2018.11.29.             |                                  | 68 600 231 Ft                   |
| 10.  | Berendezések leszállítása II. ütem: 3.blokki légkondicionáló berendezés                                                                                          | 2018.12.10.             | 609 106 EUR                      |                                 |
| 11.  | 2. ; 1. ; 4. blokkra vonatkozó gyártási, beszerzési, építési, szerelési engedélyek megléte                                                                       | 2019.01.30.             |                                  | 199 575 813 Ft                  |

4000290973 /

Ulrich István (Szakmai terület szignózása), Bódi László (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Katona Kolos (Jogi szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)

|     |                                                                                                    |             |               |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 12. | Hermetikus átvezetés készre szerelése az 4. blokkon                                                | 2019.02.21. |               | 125 999 846 Ft |
| 13. | Berendezések leszállítása II. ütem: 1. ; 4. blokki léghűtők, 1-4 blokki kúpos csapok és szivattyúk | 2019.04.30. | 1 815 222 EUR |                |
| 14. | Hermetikus átvezetés készre szerelése a 2. blokkon                                                 | 2019.05.30. |               | 94 579 422 Ft  |
| 15. | Berendezések leszállítása III. ütem: 2. blokki léghűtő                                             | 2019.07.30. | 699 714 EUR   |                |
| 16. | 3. blokki teljes körű kivitelezés, Üzembe helyezés (ÜMMD jóváhagyás)                               | 2019.09.15. | 16 535 EUR    | 293 989 896 Ft |
| 17. | 1. blokki teljes körű kivitelezés, Üzembe helyezés (ÜMMD jóváhagyás)                               | 2020.02.28. | 16 535 EUR    | 293 989 896 Ft |
| 18. | 4. blokki teljes körű kivitelezés, Üzembe helyezés (ÜMMD jóváhagyás)                               | 2020.06.15. | 16 534 EUR    | 273 156 111 Ft |
| 19. | 2. blokki teljes körű kivitelezés, Üzembe helyezés (ÜMMD jóváhagyás)                               | 2020.08.30. | 16 535 EUR    | 293 989 896 Ft |
| 20. | Megvalósulási dokumentáció 1-4. blokkon                                                            | 2020.10.20. |               | 83 997 113 Ft  |
| 21. | Tartalékkeret / Pótmunka                                                                           | 2018.12.31. |               | 140 000 000 Ft |
| 22. | Tartalékkeret / Pótmunka                                                                           | 2019.12.31. |               | 140 000 000 Ft |
| 23. | Tartalékkeret / Pótmunka                                                                           | 2020.10.31. |               | 104 164 078 Ft |

4000290973 /

Ulrich István (Szakmai terület szignózása), Bódi László (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Katona Kolos (Jogi szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)
